




2018年珠江流域部批生产建设项目 水土保持方案落实情况公告

水利部珠江水利委员会
二〇一九年三月

2018年珠江流域部管生产建设项目分布图

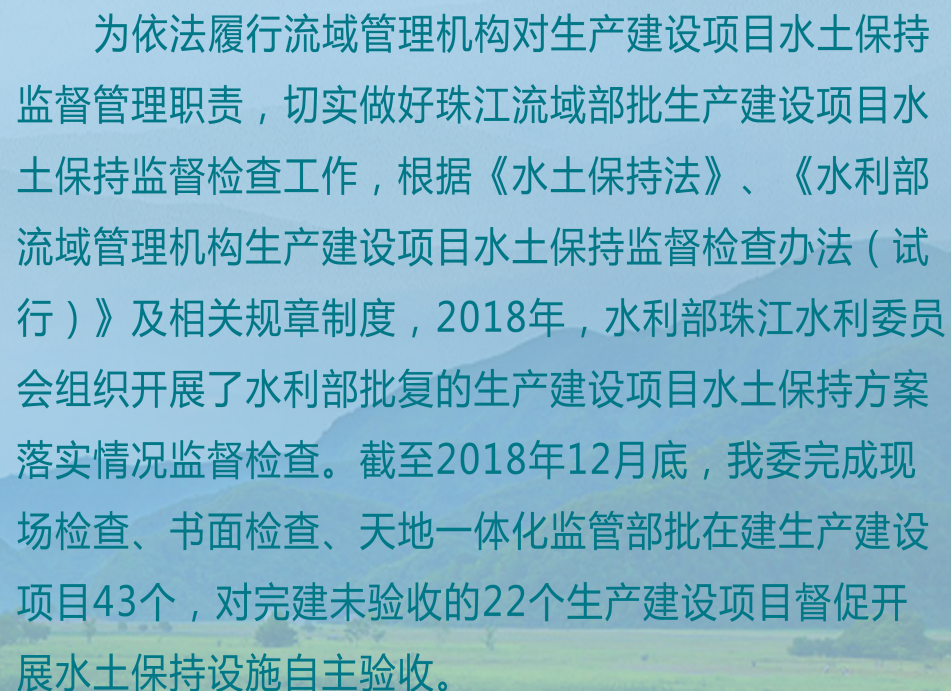

2018年珠江流域部批生产建设项目
水土保持方案落实情况表

现场检查
天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
1	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程	乐滩灌区建设管理局	2009年12月 水保〔2009〕633号	南宁市、来宾市	水利	2010年9月开工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。部分地段挖、填方边坡防护措施和排水措施实施不到位；使用完毕的弃渣场未按要求及时采取场地平整、复绿等水土保持措施。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年7月	现场检查，天地一体化监管
2	广西液化天然气（LNG）项目	广西天然气管道有限公司	2012年1月水保函〔2012〕31号	广西区北海市、钦州市、南宁市、来宾市、柳州市、玉林市、茂名市、广东省湛江市	天然气	LNG专用码头工程、接收站工程已完工投产，并由广西水利厅组织完成水土保持设施验收工作。输气管道2013年7月开工，2018年9月投产试运行。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。部分管道工程水土保持措施实施不到位；水土保持监测工作开展较为滞后；输气管道工程未缴纳水土保持补偿费。应按监督检查意见整改落实，并按规定开展水土保持设施验收工作。	2018年8月	现场检查，天地一体化监管
3	广西壮族自治区百色市澄碧河水库除险加固工程	澄碧河水库管理局	2012年5月水保函〔2012〕141号	右江区	水利	2015年1月开工，预计2019年6月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。左坝头临时堆渣未及时清运，施工过程中大坝坡面无临时苫盖措施，已造成水土流失。应按监督检查意见整改落实。	2018年8月	现场检查，天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
4	大藤峡水利枢纽工程	广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司	2013年3月 水保函〔2013〕72号	广西区桂平市	水利	2014年10月开工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。左岸弃渣场拦挡措施、排水措施尚未全部建成，部分堆渣区域堆渣高，坡度陡，渣场管理有待进一步加强；右岸施工区域水土保持措施滞后，坡面截排水、坡脚拦挡、边坡防护及临时苫盖等措施不到位，存在坡面土体滑塌、水土流失现象。应按监督检查意见整改落实。	2018年5月	现场检查， 天地一体化监管
5	海南省红岭灌区工程	海南省发展控股有限公司	2013年8月 水保函〔2013〕245号	海口市、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县	水利	2015年2月开工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。139个弃渣场位置、占地面积、弃渣数量等均发生了变化，未按规定履行变更手续；未缴纳水土保持补偿费，未按要求向我委及海南省水利厅报告水土保持方案实施情况。总干渠2标5号弃渣场未采取拦挡、排水措施，西干渠1、2号取土场未进行表土剥离，尚未进行植被恢复；水土保持植物措施实施进度滞后。水土保持监测工作开展不扎实，没有严格按照《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）有关要求开展工作。应按监督检查意见整改落实。	2018年6月	现场检查， 天地一体化监管
6	湖南省宜章县莽山水库工程	宜章县莽山水库工程建设有限公司	2013年11月 水保函〔2013〕409号	宜章县	水利	2015年9月开工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。取、弃土场的设置与批复水土保持方案相比有较大变化，没有按照相关规定履行变更手续，水土保持监测工作开展不扎实，未按要求向我委及湖南省水利厅报告水土保持方案实施情况。副坝道路边坡截排水、拦挡等措施不完善，裸露边坡未及时进行覆盖，植物措施滞后；主坝与副坝之间挖填边坡、弃渣场、临时道路等区域，临时拦挡、排水等措施不完善；上坝公路旁部分土石料、弃渣等未及时清理。应按检查意见整改落实。	2018年8月	现场检查， 天地一体化监管



大藤峡水利枢纽左岸表土暂存场



莽山水库石灰冲弃渣场

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
7	广西柳江防洪 控制性工程落久 水利枢纽工程	柳州市龙溪水利水电 投资有限公司	2015年1月水保函 〔2015〕37号	融水县	水利	2015年9月开工，总工期40个月。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。弃渣场水土保持措施滞后；牛湾弃渣场占地面积、弃渣量与水土保持方案相比均有较大幅度增加，未按有关规定履行变更手续；部分施工便道边坡防护措施滞后。应按监督检查意见整改落实。	2018年 7月	现场检查， 天地一体化 监管
8	梧州机场 迁建工程	梧州西江机场 投资开发有限公司	2015年1月水保函 〔2015〕46号	广西区藤县	机场	2016年12月开工，总工期32个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。水土保持措施依然滞后，飞行区场内临时堆土没有临时拦挡措施；部分边坡依然处于裸露状态，相应的护坡、苫盖、植物措施等滞后。超出批复防治责任范围的净空区没有采取相应水土保持措施，已产生较严重的水土流失。应按监督检查意见整改落实。	2018年 5月	现场检查， 天地一体化 监管
9	广西桂中治旱 乐滩引水灌区 二期工程	广西桂中治旱乐滩水库 引水灌区建设管理局	2015年2月水保函 〔2015〕70号	来宾市、南宁市	水利	2015年10月开工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。大部分弃渣场未按照先拦后弃原则弃渣，排水措施不完善；使用完毕的弃渣场、取土场未按要求及时采取场地平整、复绿等水土保持措施；龙安的弃渣场未采取任何防护措施，严重的水土流失；部分渡槽和明渠填方段尚未采取有效防护措施，存在较大水土流失隐患。应按监督检查意见整改落实。	2018年 7月	现场检查， 天地一体化 监管



落久水利枢纽边坡防护、道路排水



梧州机场迁建工程边坡绿化


序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
10	云南省文山州德厚水库工程	文山州德厚水库建设管理处	2015年3月 水保函〔2015〕103号	文山市	水利	2015年12月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。输水管道、明渠段施工道路下边坡，改建平远-文山公路段下边坡没有采取防护措施；石料场临时拦挡措施不完善，已造成水土流失；输水管道1号弃渣场位置变更，现选址应进一步比选。应按监督检查意见整改落实。	2018年7月	现场检查，天地一体化监管
11	海南省海口市南渡江引水工程	葛洲坝（海口）引水工程投资有限公司	2015年3月 水保函〔2015〕112号	海口市、文昌市、琼海市、定安县、屯昌县	水利	2015年11月开工，总工期48个月。开展了水土保持专项监理工作。未开展水土保持监测工作、未按规定履行变更手续、未缴纳水土保持补偿费、未按水利部批复要求向我委和海南省水务厅报告水土保持方案实施情况。4个弃渣场位置、占地面积、弃渣数量等均发生了变化，未按规定履行变更手续；3号支洞弃渣场排水不畅，积水严重；水土保持专项监理工作不扎实，监理人员对项目情况不了解；水土保持措施实施进度严重滞后。应按监督检查意见整改落实。	2018年6月	现场检查，天地一体化监管
12	广东省韩江高陂水利枢纽工程	广东省韩江高陂水利枢纽工程建设管理处	2015年4月 水保函〔2015〕152号	大埔县	水利	2015年11月开工，计划于2021年6月完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。移民安置区及专项设施改建等防治区水土保持防治责任不明确，施工现场临时防护措施不到位。应按监督检查意见整改落实。	2018年5月	现场检查，天地一体化监管



云南省德厚水库枢纽区1#弃渣场



云南省德厚水库枢纽区1#弃渣场

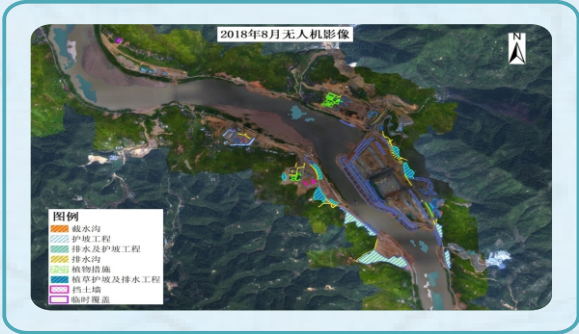

广东省高陂水利枢纽工程措施

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
13	贵州省兴义市马岭水利枢纽工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2015年5月水保函〔2015〕192号	兴义市	水利	2015年11月开工，总工期38个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。施工生产场地排水、边坡防护措施不完善，存在水土流失隐患；二级泵站及其施工便道均未采取排水、拦挡和边坡防护措施；供水管道管槽开挖未按要求采取表土剥离、保存措施，开挖土方临时堆土未采取必要的临时拦挡、苫盖措施，容易造成水土流失；河道右岸坡面临时堆渣未采取防护措施。应按监督检查意见整改落实。	2018年6月	现场检查，天地一体化监管
14	云南省曲靖市阿岗水库工程	曲靖市阿岗水库工程建设管理局	2015年8月水保函〔2015〕344号	罗平县、陆良县、麒麟区	水利	2016年10月开工，总工期48个月。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。1#弃渣场水土保持措施实施进度滞后，挡渣墙依然没有封闭，已造成水土流失；临时截排水措施不完善，存在水土流失隐患；石料场截排水、临时拦挡措施不完善，已造成水土流失；水土保持监理工作开展不扎实。应按监督检查意见整改落实。	2018年7月	现场检查，天地一体化监管
15	贵州省黄家湾水利枢纽工程	贵州省水利投资（集团）有限责任公司	2015年11月水保函〔2015〕467号	紫云县	水利	2016年7月开工，建设总工期48个月。水土保持监理与主体工程监理一并开展。尚未开展水土保持监测工作。水土保持管理不到位；施工现场管理不善，乱堆乱弃现象严重；主坝区河道两侧施工便道沿河填筑，部分路段已遭水冲垮塌，淤积河道，影响行洪；施工便道排水、坡面防护措施不到位；主坝区至石料场区施工便道未采取排水、坡面防护措施，开挖土方未按要求弃置；石料场未采取拦挡、截排水等措施，开采石料沿坡面倾泻，存在较大安全隐患；生产便道开挖土方沿坡面弃置，边坡植被破坏严重；右岸1号弃渣场未按要求弃渣，排水、拦挡、坡面防护措施不完善。应按监督检查意见整改落实。	2018年6月	现场检查，天地一体化监管



黄家湾水利枢纽弃场拦挡

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
16	柴石滩水库灌区工程	昆明柴石滩水库灌区工程建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕85号	云南省宜良县、石林县	水利	2016年10月开工，计划2020年6月完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。西干渠1号弃渣场未采取拦挡、排水措施，未进行表土剥离；总干渠3号弃渣场堆渣管理差，无序弃渣；部分施工现场临时措施不到位，道路开挖、回填边坡没有截排水沟、弃渣随意；弃渣场没有进行表土剥离，没有及时设置拦挡、截排水措施。应按监督检查意见整改落实。	2018年7月	现场检查， 天地一体化监管
17	滇中引水工程	滇中引水工程建设管理局	2016年3月 水保函〔2016〕86号	云南省丽江市、大理州、楚雄市、昆明市、玉溪市、红河州	水利	工程在珠江流域内部分未开工。	2018年6月	书面检查， 天地一体化监管
18	广西左江治旱驮英水库及灌区工程	左江治旱建设管理局	2016年5月 水保函〔2016〕184号	江州区、扶绥县、宁明县	水利	2016年10月开工，预计2020年12月完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分水土保持措施实施滞后，存在水土流失隐患；边坡防护中的植物措施普遍滞后，部分水土保持措施实施标准偏低，防护效果差；枢纽区河道两侧生产便道排水和坡面防护措施不到位；表土剥离和保存工作不到位。应按监督检查意见整改落实。	2018年8月	现场检查， 天地一体化监管

2018年珠江流域部批生产建设项目水土保持方案落实情况表

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
19	新建铁路贵阳至南宁客运专线（广西段）	云桂铁路广西有限责任公司（广西段）	2016年6月水保函〔2016〕227号	广西河池市、南宁市	铁路	2016年12月开工，预计2023年底开通。水土保持工程与主体工程监理单位一起开展。未开展水土保持监测工作。未缴纳水土保持补偿费。二塘双线特大桥表土剥离、灵泉屯双线特大桥表土堆存管理不够规范；都安隧道口坡面排水措施不到位，隧洞弃渣未采取防护措施；东江工区拌合站排水与周边沟道衔接不畅。应按监督检查意见整改落实。	2018年8月	现场检查，天地一体化监管
20	新建赣州至深圳客运专线	中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部	2016年11月水保函〔2016〕424号	江西省赣州市、广东省河源市、惠州市、东莞市、深圳市	铁路	2016年12月开工，计划2021年9月完工。水土保持工程与主体工程监理单位一起开展。未开展水土保持监测工作。未缴纳水土保持补偿费。部分标段未按水土保持方案和后续设计要求实施水土保持措施，存在较大水土流失隐患；大部分标段不能按要求剥离、保存表土；部分标段已实施水土保持措施标准不高，防治水土流失效果较差。应按监督检查意见整改落实。	2018年5月	现场检查，天地一体化监管
21	广西玉林民用机场工程	玉林交通旅游投资集团有限公司	2016年12月水保函〔2016〕447号	福绵区	机场	2016年11月开工，预计2019年底完工。开展了水土保持监测工作，水土保持工程与主体工程监理单位一起开展，已缴纳水土保持补偿费。水土保持措施实施进度依然滞后，飞行区周边有部分边坡未实施防护和边坡绿化以及临时苫盖措施。场内截排水措施不到位，已造成水土流失。应按监督检查意见整改落实。	2018年5月	现场检查，天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
22	韶关机场改扩建工程	广东省机场管理集团公司	2017年1月 水保函〔2017〕1号	韶关市	机场	主体工程未开工。	2018年6月	书面检查， 天地一体化监管
23	广东阳江核电站（6×1000MW）工程	阳江核电有限公司	2008年11月 水保函〔2008〕295号	阳东县	核电	2008年12月开工，预计于2019年7月全部投入商业运营。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。各项水土保持措施已基本落实。少部分边坡绿化滞后。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年6月	书面检查， 天地一体化监管
24	海南省大广坝水利水电二期（灌区）工程	海南省水利电力发展有限公司	2007年3月 水保〔2007〕95号	海南省东方市、昌江县、乐东县	水利	2007年9月开工。工程仅剩陀兴干渠工程的两个标段未完工，开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。完工部分各项水土保持措施已基本落实，在建部分弃渣场围挡防护不到位。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年6月	书面检查， 天地一体化监管



阳江核电边坡及平台绿化

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
25	台山核电站 一期工程	台山核电合营 有限公司	2009年5月水保函 〔2009〕187号	台山市	核电	2009年9月开工。1号机组于2018年6月并网发电。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。各项水土保持措施已基本落实。预留地植被恢复效果不佳。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年 6月	书面检查， 天地一体化 监管
26	黔中水利枢纽 一期工程	贵州省水利 投资有限责任公司	2009年5月 水保〔2009〕252号	贵州省贵阳市、安顺市、 六盘水市、黔南州	水利	2009年11月开工，主体工程已基本完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。各项水土保持措施已基本落实。部分弃渣场水土保持设施遭人为毁损。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年 6月	书面检查， 天地一体化 监管
27	海南昌江核电厂 一期工程	海南核电有限公司	2009年9月水保函 〔2009〕330号	昌江县	核电	2010年4月开工，2015年8月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。1、2号弃渣场整体清运尚未完成，相应的水土保持措施没有实施。应尽快完善水土保持措施并开展水土保持验收工作。	2018年 6月	书面检查， 天地一体化 监管



昌江核电一期渣场边坡防护

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
28	广东陆丰核电一期工程	中广核陆丰核电有限公司	2012年8月水保函〔2012〕216号	陆丰市	核电	主体工程尚未开工。已开展水土保持监测、监理工作。未缴纳水土保持补偿费。已实施场平工程部分水土保持措施。应按照核准的规模完善变更相关手续，并按批复水土保持方案要求落实各项工作。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
29	海口美兰国际机场二期扩建工程	海口美兰国际机场有限责任公司	2013年3月水保函〔2013〕75号	海口市	机场	2016年5月开工，计划2019年7月土建完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作，已缴纳水土保持补偿费。场区临时堆渣凌乱，没有采取临时拦挡、苫盖措施；场区周边部分开挖及回填边坡没有按要求实施边坡防护措施，已造成水土流失。接入玉屋河的排水口虽已建临时沉砂池，但效果不明显，已有泥沙流入玉屋河，造成水土流失。应按监督检查意见整改落实。	2018年10月	现场检查
30	广州白云国际机场扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	2013年9月水保函〔2013〕298号	花都区	机场	2012年8月开工，2018年2月完工。开展了水土保持监测，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。应尽快完善各项水土保持设施并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管



白云机场2号航站楼景观绿化措施



白云机场2号航站楼停车场绿化措施

2018年珠江流域部批生产建设项目水土保持方案落实情况表

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
31	中国石化新疆煤制气外输管道工程（新粤浙管道）	中国石化新疆梅制天然气外输管道有限责任公司	2013年10月 水保函〔2013〕432号	新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、湖南、广东	天然气	2017年9月开工，计划2021年6月完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳水土保持补偿费。部分临时措施不完善，部分边坡裸露，防护措施不及时。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
32	黎湛铁路电气化改造工程	中国铁路南宁局集团有限公司黎湛铁路电气化改造工程建设指挥部	2014年6月 水保函〔2014〕176号	广西区南宁市、贵港市、玉林市、广东省湛江市	铁路	2014年12月开工，预计2019年底完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。已缴纳部分水土保持补偿费。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
33	防城港核电厂二期（2×HL1000-1）工程	广西防城港核电有限公司	2015年4月 水保函〔2015〕147号	港口区	核电	二期工程3、4号机组分别于2015年12月、2016年12月开工，计划2022年完工。开展了水土保持监测工作，水土保持监理与主体工程监理一并开展。二期临时弃渣场拦挡设施不完善，存在水土流失隐患。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
34	西气东输三线闽粤支干线工程	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	2015年7月 水保函〔2015〕292号	广东省广州市、惠州市、河源市、梅州市、揭阳市、潮州市	天然气	2018年6月开工，预计2019年12月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。未缴纳水土保持补偿费。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
35	滇西北至广东特高压直流输电工程	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	2015年11月水保函〔2015〕519号	云南省、贵州省、广西区、广东省	输变电	2016年1月开工，2018年6月完工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。已缴纳水土保持补偿费。各项水土保持设施基本完成。应尽快完善部分植被恢复及临建拆除，并按照规定开展水土保持设施验收工作。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
36	中广核广东太平岭核电厂一期工程	中广核惠州核电有限公司	2016年5月水保函〔2016〕178号	惠东县	核电	2016年9月开工，总工期92个月，一期场平工程已全面开工。开展了水土保持监测、水土保持专项监理工作。部分裸露地表有冲刷，部分临时排水沉沙系统淤堵损毁。应按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管
37	焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程	中国铁路南宁局集团有限公司柳州铁路工程建设指挥部	2017年1月水保函〔2017〕20号	湖南省怀化市，广西区河池市、柳州市	铁路	2017年12月开工，计划2020年底完工。开展了水土保持监测，水土保持专项监理与主体工程同步开展。未缴纳水土保持补偿费。部分弃渣场发生了变化，未按规定履行变更手续。应尽快完善弃渣场的变更手续，并按批复水土保持方案要求落实各项工作。	2018年6月	书面检查，天地一体化监管



滇西北工程直流线路3568号塔植被恢复



太平岭核电临时苫盖措施

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
38	新建地方铁路罗定至岑溪线	中铁（罗定岑溪）铁路有限公司	2007年5月水保函〔2007〕131号	广东省罗定市，广西区岑溪市	铁路	天地一体化监管过程中，未发现施工活动。	2018年6月	天地一体化监管
39	广西百色水利枢纽过船设施工程	尚未明确	2013年5月水保函〔2013〕128号	右江区	水利	遥感监测未发现施工活动。	2018年5月	天地一体化监管
40	新建合浦至湛江铁路	南宁铁路局	2014年9月水保函〔2014〕315号	广西区北海市,广东省湛江市	铁路	遥感监测未发现施工活动。	2018年5月	天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
41	海南省南渡江迈湾水利枢纽工程	海南海控水利建设有限公司	2016年11月水保函〔2016〕429号	儋州市、澄迈县、屯昌县、琼中县	水利	遥感监测未发现施工活动。	2018年7月	天地一体化监管
42	珠江三角洲水资源配置工程	广东省供水工程管理总局	2017年11月水许可决〔2017〕28号	广东省佛山市、广州市、东莞市、深圳市	水利	遥感监测发现有施工活动。	2018年4月	天地一体化监管
43	武钢防城港钢铁基地项目	武汉钢铁（集团）公司	2008年11月水保函〔2008〕300号	港口区	钢铁	遥感监测未发现施工活动。（该项目停建）	2018年4月	天地一体化监管

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式	备注
44	湛江钢铁项目	宝钢集团有限公司	2008年5月水保函〔2008〕111号	广东省湛江市东海岛开发区	钢铁	2009年5月开工，2017年11月完工。2018年7月通过自主验收并向水利部报备，2018年11月通过我委组织的验后核查。		督促验收	自验已核查
45	广西防城港红沙核电项目一期（2×1000 MW）工程	广西防城港核电有限公司	2009年12月水保函〔2009〕375号	港口区	核电	一期工程2010年7月开工，1、2号机组分别于2015年底、2016年相继投入商业运行。2018年4月通过自主验收并向水利部报备，2018年9月通过我委组织的验后核查。		督促验收	自验已核查
46	新建铁路贵阳至广州线	贵广铁路有限责任公司	2008年4月水保函〔2008〕218号	贵州省、广西区、广东省	铁路	2009年5月开工，2017年11月完工。2018年11月通过自主验收并向水利部报备。	2018年11月	督促验收	自验已备案



防城港核电一期



贵广铁路路基防护

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式	备注
47	云南金沙江中游电站送电广西直流输电工程	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	2011年5月水保函〔2011〕154号	云南省、广西区	输变电	2014年4月开工，2016年6月完工。2018年3月通过自主验收并向水利部报备。	2018年11月	督促验收	自验已备案
48	贵昆铁路六盘水至沾益段增建第二线工程（成都局段）	中国铁路成都局集团有限公司	2006年2月水保函〔2006〕57号	贵州省六盘水市、毕节市、云南省曲靖市	铁路	2009年5月开工，2017年11月完工。2018年7月通过自主验收并向水利部报备，2018年12月通过我委组织的验后核查。	2018年10月	督促验收	自验已备案
49	兴仁经独山至桂南输变电工程（500kV 桂南输变电工程）	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	2011年7月水保函〔2011〕184号	贵州省、广西区	输变电	2014年12月开工，2018年10月完工。2018年10月通过自主验收并向水利部报备。	2018年11月	督促验收	自验未备案
50	新建铁路厦门至深圳铁路	东南沿海铁路福建有限责任公司、厦深铁路广东有限公司	2007年7月水保函〔2007〕204号	福建省厦门市、漳州市、广东省潮州市、汕头市、汕尾市、揭阳市、惠州市、深圳市	铁路	工程于2008年1月开工，2013年12月完工。福建段已于2016年8月17日通过水土保持专项验收。广东段2018年12月通过自主验收。	2019年	督促验收	自验未备案



六盘水至沾益段增建第二线工程
曹家沟隧道进口渣场



厦深高铁渣场绿化

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
51	新建铁路赣龙线 赣州至龙岩段 工程	南昌铁路局赣龙铁路 工程建设指挥部	2001年5月 水函〔2001〕25号	江西省赣州市, 福建省龙岩市	铁路	主体工程已完建并投入运行多年。	2018年 4月	督促验收
52	天生省桥至广东 第三回500K V 交流输变电工程	中国南方电网 超高压输变电公司	2003年2月水函 〔2003〕8号	广西区、广东省	输变电	主体工程已完建并投入运行多年。	2018年 4月	督促验收
53	贵州至广东交、 直流500K V 输变电工程	中国南方电网 超高压输变电公司	水函〔2003〕13号	贵州省、广西区、 广东省	输变电	主体工程已完建并投入运行多年。	2018年 4月	督促验收
54	三峡输变电和 全国联网工程 在建项目	国家电网公司电网 建设分公司	2004年7月水函 〔2004〕122号	湖北省、湖南省、 广东省等	输变电	主体工程已完建并投入运行多年。	2018年 4月	督促验收

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
55	广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程斧子口水利枢纽	桂林市大禹水利基础设施建设工程有限公司	2009年3月水保函〔2009〕69号	兴安县	水利	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收
56	广西桂林市防洪及漓江补水枢纽工程小溶江水利枢纽	桂林市大禹水利基础设施建设工程有限公司	2009年3月水保函〔2009〕70号	灵川县、兴安县	水利	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收
57	海南省万泉河红岭水利枢纽工程	海南省红岭水利枢纽有限公司	2009年8月水保〔2009〕404号	琼中县	水利	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收



广西桂林市小溶江水库

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式
58	改建铁路赣州至龙岩铁路扩能改造工程	南昌铁路局	2010年8月水保函〔2010〕241号	江西省赣州市,福建省龙岩市	铁路	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收
59	新建长沙至昆明铁路客运专线	沪昆铁路客运专线贵州公司、云南公司	2010年1月水保函〔2010〕309号	湖南省、贵州省、云南省	铁路	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收
60	新建铁路云桂线	云桂铁路云南有限责任公司、云桂铁路广西有限责任公司	2011年7月水保函〔2011〕188号	广西区、云南省	铁路	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收
61	南宁吴圩国际机场新航站区及配套设施建设工程	南宁机场扩建工程指挥部	2011年3月水保函〔2011〕77号	南宁市	输变电	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收

序号	项目名称	项目法人或建设单位	方案批复时间及文号	建设地点	行业类别	水土保持工作开展情况	检查时间	检查方式	备注
62	海南省琼海博鳌机场项目	琼海市城市投资建设有限公司	2012年5月水保函〔2012〕130号	琼海市	机场	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收	
63	西气东输三线天然气管道东段干线(吉安-福州)工程	中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	2013年12月水保函〔2013〕439号	江西省、福建省	天然气	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收	
64	南方主网与海南电网第二回联网工程	中国南方电网超高压输电公司	2014年4月水保函〔2014〕86号	广东省、海南省	输变电	主体工程已完建并投入运行。	2018年4月	督促验收	
65	云南威信电厂镇雄电厂多乐500kV输变电工程	云南电网有限责任公司	2015年1月水保函〔2015〕45号	贵州省赫章县、威宁县, 云南省威信县、镇雄县、宣威市	输变电	2016年2月开工, 2017年7月完工。2018年6月通过自主验收。	2018年4月	督促验收	自验未备案
